




Relatório de Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2025



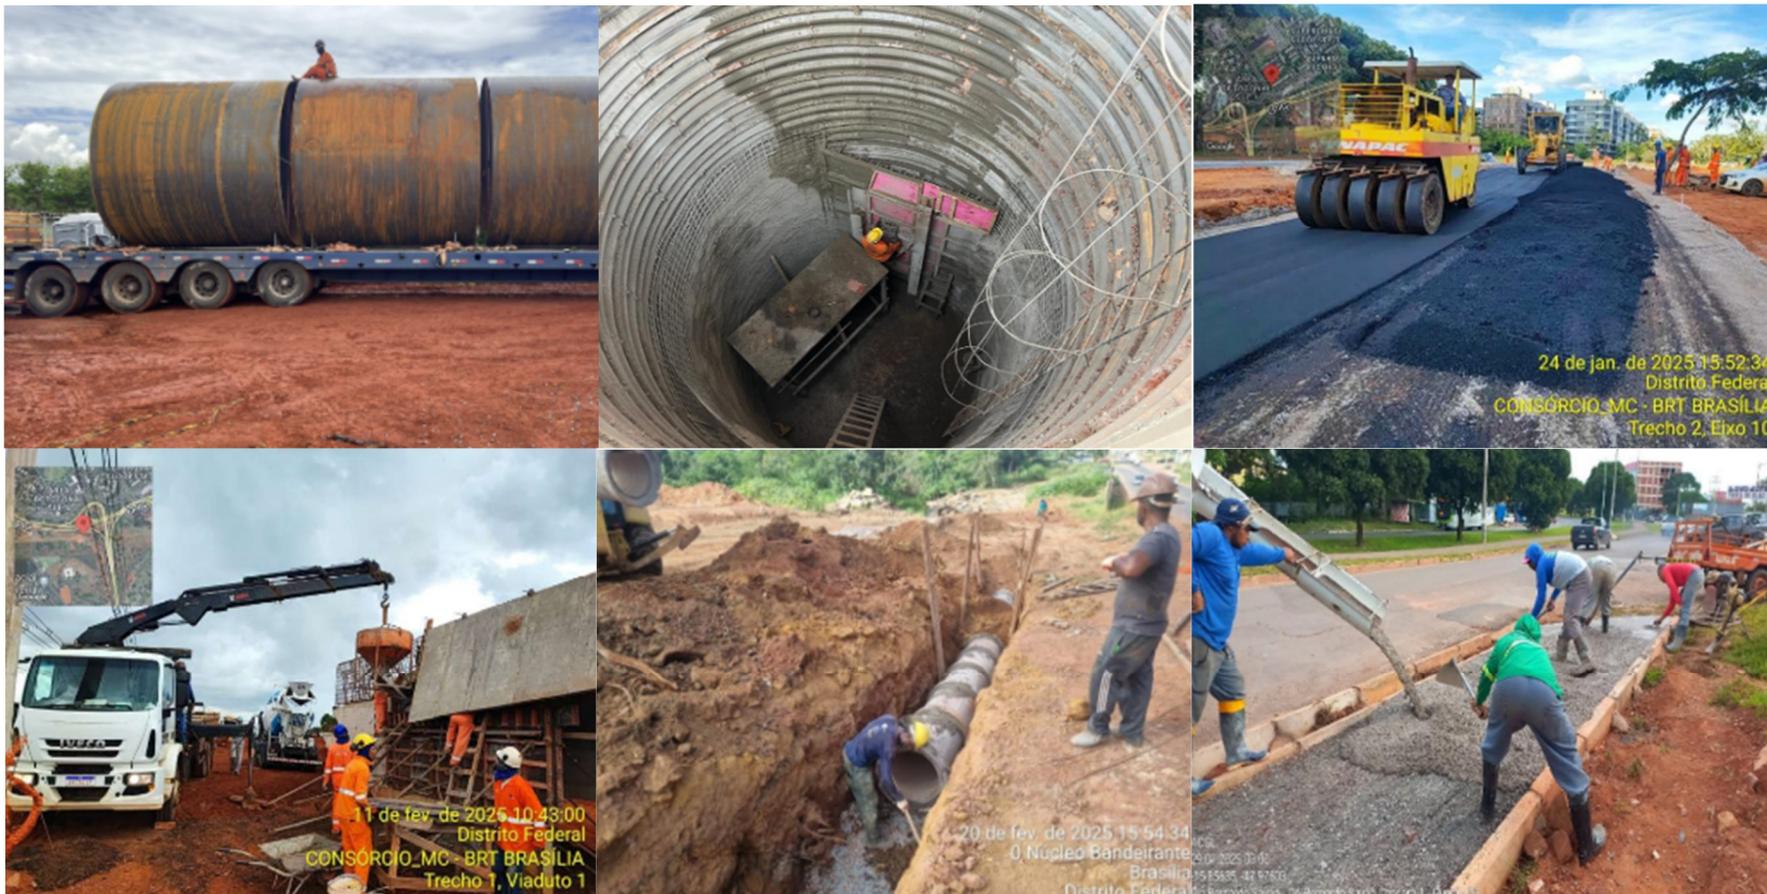

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2025

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
15.122.8209.8502.0020 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - DISTRITO FEDERAL									
0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. 1 - Institucional 8502 - Atividade -	261 - SERVIDOR REMUNERADO - MES	1 - UNIDADE	200	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 261 - SERVIDOR REMUNERADO - MES - jan: 188,00; fev: 189,00; Detalhamento: Servidores ativos remunerados. Processo(s) nº: 00110-00000227/2025-38, 00110-00000617/2025-16 Descentralização									

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
15.122.8209.8504.0015 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - DISTRITO FEDERAL									
0002 - Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. 1 - Institucional 8504 - Atividade -	40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	1 - UNIDADE	200	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES - jan: 170,00; fev: 175,00; Detalhamento: Benefícios concedidos: auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio creche/pré-escola e auxílio natalidade. Processo(s) nº: 00110-00000227/2025-38, 00110-00000617/2025-16 Descentralização</p>									

15.122.8209.8517.0034 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - DISTRITO FEDERAL									
0003 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. 1 - Institucional 8517 - Atividade -	322 - UNIDADE MANTIDA	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 322 - UNIDADE MANTIDA - jan: 1,00; fev: 1,00; Detalhamento: Aquisição de: carimbos; serviços de manutenção preventiva, desinstalação e reinstalação no aparelhos de Ar condicionada e cortina de Ar e Serviço de manutenção preventiva e corretiva no portão eletrônico e porta automática das dependências desta Secretária. Processo(s) nº: 00110-00003268/2024-03, 00110-00000251/2024-96, 00110-00000032/2820-24 Descentralização</p>									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
15.126.8209.2557.0029 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL									
0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. 1 - Institucional 2557 - Atividade -	2 - AÇÃO IMPLEMENTADA	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 2 - AÇÃO IMPLEMENTADA - jan: 1,00; fev: 0,00; Detalhamento: Serviços de telefonia fixa baseada na tecnologia de Voz sobre IP - VOIP; serviços de outsourcing de Impressão, com disponibilização de impressoras multifuncionais. Processo(s) nº: 00110-00000935/2023-15, 00110-0000096/2024-16 Descentralização</p>									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
(**) 15.451.6208.1968.0018 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL									
0005 - Executar serviços geotécnicos/geológicos (lote 1) e de controle tecnológico/laboratorial (lote 2), destinados a elaboração de projetos e à fiscalização/ acompanhamentos das obras. Etapa anterior nº 0005/2024 - UO 22101 1 - Institucional 1968 - Projeto -	221 - PROJETO ELABORADO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/08/2023	28/02/2025	-	-	AN-Anulada
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 221 - PROJETO ELABORADO - jan: 0,00; fev: 0,00; Detalhamento: Sem realização no período. Executado até 2024: 43,02%. Executado até 2023: 35,89%. Contrato nº 16/2023 (MGR, JFF). Processo(s) nº: 00110-00000520/2023-33, 00110-00002389/2023-49 Descentralização</p>									
0035 - Revisar e readequar os projetos executivos de infraestrutura urbana na Região Administrativa do Sol Nascente/Pôr do Sol, especificamente em poligonal do Pôr do Sol - RA SOL. 1 - Institucional 1968 - Projeto -	221 - PROJETO ELABORADO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	13/02/2026	-	-	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 221 - PROJETO ELABORADO - jan: 0,00; fev: 0,00; Detalhamento: Realizado no período: Coordenação (1,15%) e Plano de Trabalho (100%). Executado no período: 2,23% dos serviços. Acumulado em 2025: Coordenação (1,15%) e Plano de Trabalho (100%). Executado em 2025: 2,23%. CT 17/2024 (MG/CS). Processo(s) nº: 00110-00001440/2023-03 Descentralização</p>									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
(**) 15.451.6208.1968.0018 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL									

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
15.451.6209.1110.0147 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL									
0006 - Requalificar o Setor de Oficinas Sul - SOF Sul. Etapa anterior nº 0007/2024 - UO 22101 1 - Institucional 1110 - Projeto 3 - Obras de urbanização	28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	29.476	99 - DISTRITO FEDERAL	01/04/2023	02/06/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 28 - ÁREA URBANIZADA - jan: 0,00; fev: 0,00; Detalhamento: Realizado no período: Drenagem (508m). Executado no período: 1,6% dos serviços. Acumulado até 2025: Escavação da lagoa (155.735m³), drenagem pluvial (5.912m) e pav. asfáltica (27.032m²). Executado até 2025: 47% dos serviços. Realizado até 2024: escavação da lagoa (155.735m³), drenagem pluvial (5.404m) e pav. asfáltica (27.032m²). Executado até 2024: 45,40%. Executado em 2023: 10,18%. Contrato nº 24/2022 (TG). Processo(s) nº: 00110-00000583/2021-28 Descentralização</p>									
0007 - Executar obras de duplicação, com extensão aproximada de 1,2 km, da Via de Ligação Guará - Núcleo Bandeirante. Etapa anterior nº 0008/2024 - UO 22101 1 - Institucional 1110 - Projeto 3 - Obras de urbanização	28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	11.315	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2023	07/08/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 28 - ÁREA URBANIZADA - jan: 0,00; fev: 0,00; Detalhamento: Realizado no período: drenagem pluvial (93m), calçadas (1.571m²), meios-fios (678m) e paisagismo (8.840m²). Executado no período: 4,9% dos serviços. Acumulado até 2025: drenagem pluvial (763m), calçadas (3.214m²), meios-fios (3.336m) e paisagismo (8.840m²). Executado até 2025: 64,70%. Realizado em 2024: drenagem pluvial (670m), calçadas (1.643m²), ciclovia (4.138m²), pavim. asfáltica (17.666m²), meios-fios (2.658m) e OAE sobre Córrego VP (24%). Executado até 2024: 59,80%. Executado em 2023: 1,00%. Contrato nº 23/2023 (LAGM). Processo(s) nº: 00110-00001839/2022-03, 00110-00003176/2023-34 Descentralização</p>									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
15.451.6209.1110.0147 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL									
0028 - Recompôr o paisagismo do Viaduto da EPIG - Parque da Cidade.									
Etapa anterior nº 0066/2024 - UO 22101									
1 - Institucional	28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	1	99 - DISTRITO FEDERAL	07/09/2024	02/01/2025	-	-	CO-Concluída
1110 - Projeto									
3 - Obras de urbanização									
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 28 - ÁREA URBANIZADA - jan: 130000,00; Detalhamento: Etapa física finalizada. Realizados os serviços de paisagismo/plantio de grama nas áreas adjacentes ao viaduto da EPIG - Parque da Cidade. Processo(s) nº: 00112-00019424/2024-93 Descentralização Unidade Orçamentária Executora: 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL Portaria(s) Conjunta(s): Portaria Conjunta nº 04, de 05/08/2024, DODF de 06/08/2024 Objeto: Descentralização de créditos orçamentários (00110-00017059/2024-82), no valor total de R\$ 9.927.381,78, sendo: R\$ 877.381,78, destinados à execução do projeto de recomposição paisagística do Viaduto da EPIG - Parque da Cidade.</p>									
0029 - Executar obras de urbanização em diversos locais do DF.									
Etapa anterior nº 0067/2024 - UO 22101									
1 - Institucional	28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	1	99 - DISTRITO FEDERAL	03/09/2024	02/01/2025	-	-	CO-Concluída
1110 - Projeto									
3 - Obras de urbanização									
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 28 - ÁREA URBANIZADA - jan: 1,00; Detalhamento: Etapa finalizada. Serviços realizados: Implantação de meios-fios em Ceilândia, Sol Nascente e Av. Hélio Prates; Aquisição de CAP 30/45 e massa asfáltica - alça de acesso ao Viaduto de Taguatinga c/ DF-085 EPTG, QD 701 próximo à Fabrica da Linguixa (Por Sol), Rua 04 e ao longo da Av. Principal</p>									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
15.451.6209.1110.0147 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL									
(Arniqueira), Av. da Misericórdia (Vicente Pires) e Av. do Trem Bom (Sol Nascente); Implantação de calçadas/ciclovias - proximidades da Rota de Fuga - Sia/Guará/Lúcio Costa e Implantação de paisagismo e plantio de grama - Complexo Viário Gov. Roriz. Processo(s) nº: 00110-00017059/2024-82, 00112-00019424/2024-93 Descentralização Unidade Orçamentária Executora: 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL Portaria(s) Conjunta(s): Portaria Conjunta nº 06, de 04 de outubro de 2024, DODF nº 194, de 09/10/2024 Objeto: Descentralização de créditos de R\$ 5.780.000,00 visando dar atendimento à solicitação formalizada mediante o Ofício nº 2756/2024 - NOVACAP/PRES (00110-00019424/2024-93).									
0030 - Executar obras de restauração/recuperação de pavimento nos segmentos 3A e 12 da Rodovia DF-009 - Lago Norte. Etapa anterior nº 0071/2024 - UO 22101 1 - Institucional 1110 - Projeto 3 - Obras de urbanização	28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	24.505	99 - DISTRITO FEDERAL	02/12/2024	28/03/2025	-	-	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 28 - ÁREA URBANIZADA - jan: 0,00; fev: 0,00; Detalhamento: Realizado no período: Fresagem (254m³) e Pav. asfáltica (9.943m²). Executado no período: 25%. Acumulado até 2025: Fresagem (254m³) e Pav. asfáltica (9.943m²). Executado até 2025: 26%. Realizado em 2024: Canteiro de obras (54%). Executado até 2024 (1%). Contrato nº 9/2024 (LM). Processo(s) nº: 00110-00001043/2024-12 Descentralização									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
15.451.6209.1133.0001 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - DISTRITO FEDERAL									
0033 - Implantar rede elétrica de média e baixa tensão na Rua 1 e na Rua Principal do Assentamento 26 de Setembro. 1 - Institucional 1133 - Projeto 2 - Obras de energia elétrica e iluminação pública	519 - INFRAESTRUTURA DE ENERGIA IMPLANTADA	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	02/01/2025	03/06/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 519 - INFRAESTRUTURA DE ENERGIA IMPLANTADA - jan: 0,00; fev: 0,00; Detalhamento: Realizado no período: Elaboração/adequação de projeto (1%); Aquisição de materiais (16,5%); Implantação, energização e transferência de rede de distribuição (37%). Executado no período: 54,5% dos serviços. Acumulado em 2025: Elaboração/adequação de projeto (1%); Aquisição de materiais (16,5%); Implantação, energização e transferência de rede de distribuição (37%). Executado em 2025: 54,5% dos serviços. Contrato nº 13/2024 (EGT). Processo(s) nº: 00110-00000315/2024-59 Descentralização</p>									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
15.451.6209.1948.0001 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF - REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES - DISTRITO FEDERAL									
0025 - Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 1). Etapa anterior nº 0043/2024 - UO 22101 1 - Institucional 1948 - Projeto 3 - Obras de urbanização	218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	10/03/2022	08/05/2025	-	-	AT-Atrasada
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 218 - PROGRAMA REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; Detalhamento: Realizado no período: 1,27% dos Projetos Executivos. Acumulado até 2025: 90,52% dos Projetos Executivos; 40% do Orçamento, 100% dos Estudos Preliminares e 100 % do Plano de Trabalho. Executado até 2025: 92,01% dos serviços (165431743). Acumulado até 2024: 89,25% dos Projetos Executivos; 40% do Orçamento, 100% dos Estudos Preliminares e 100% do Plano de Trabalho. Executado até 2024: 92% dos serviços (158883762). Executado até 2023: 85% dos serviços. Lote 01-Contrato nº 3/2022 (BOS GCP). Processo(s) nº: 00110-00003128/2020-01, 00110-00001212/2022-44 Descentralização</p>									
0026 - Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 2). Etapa anterior nº 0044/2024 - UO 22101 1 - Institucional 1948 - Projeto 3 - Obras de urbanização	218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	10/03/2022	07/05/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 218 - PROGRAMA REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; Detalhamento: Realizado no período: 2% dos Projetos Executivos. Executado no período: 2% dos serviços. Acumulado até 2025: 95% dos serviços. Acumulado até 2024: 89% dos Projetos Executivos; 40% do Orçamento, 100% dos Estudos Preliminares e 100% do Plano de Trabalho. Executado até 2024: 93% dos serviços (158884800). Executado até 2023: 85% dos serviços. Lote 02 - Contrato nº 4/2022 (LWC, FAMP).</p>									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
15.451.6209.1948.0001 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF - REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES - DISTRITO FEDERAL									
Processo(s) nº: 00110-00003128/2020-01, 00110-00001220/2022-91 Descentralização									

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
(*) 15.451.6209.3023.0073 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO-									
0008 - Executar obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 4. Etapa anterior nº 0009/2024 - UO 22101 1 - Institucional 3023 - Projeto 3 - Obras de urbanização	218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	714.148	82 - DF - REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II	01/04/2023	18/12/2025	-	-	PA-Paralisada
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 218 - PROGRAMA REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; Detalhamento: Sem realização no período. Acumulado até 2025: 17,30% dos serviços. Realizado até 2024: limpeza (8.610m²), drenagem (283m), pavimento asfáltico (3.934m²), meios-fios (1.668m), pavimento intertravado (1.908m²) e calçadas (2.007m²). Executado em 2024: 17,30%. Executado em 2023: 1,71%. Contrato nº 1/2023 (LM) Processo(s) nº: 00110-00000512/2023-97, 00110-00000528/2022-19 Descentralização</p>									
0009 - Executar obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 1. Etapa anterior nº 0010/2024 - UO 22101 1 - Institucional 3023 - Projeto 3 - Obras de urbanização	218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	561.550	82 - DF - REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II	01/04/2023	31/12/2025	-	-	AT-Atrasada
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 218 - PROGRAMA REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; Detalhamento: Realizado no período: bacia de detenção (1%). Acumulado até 2025: pavimentação (4.859m²), drenagem pluvial (992m) e bacia de detenção (1%). Executado até 2025: 8,30% dos serviços. Realizado até 2024: pavimentação (4.859m²) e drenagem pluvial (992m). Executado até 2024: 8,28%. Executado em 2023: 4,78%. Contrato nº 5/2023 (BS). Processo(s) nº: 00110-00003137/2021-75, 00110-00001118/2023-76 Descentralização</p>									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
(*) 15.451.6209.3023.0073 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO-									

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
(*) 15.451.6209.3023.0077 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES									
0010 - Executar obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Vicente Pires. Etapa anterior nº 0012/2024 - UO 22101 1 - Institucional 3023 - Projeto 3 - Obras de urbanização	218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	304.290	30 - REGIÃO XXX - VICENTE PIRES	01/07/2021	21/07/2025	-	-	AT-Atrasada
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 218 - PROGRAMA REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; Detalhamento: Realizado no período: Terraplenagem (2.800m²) e plantio de grama (2.800m²). Acumulado até 2025: Escavação para drenagem pluvial (94.003m³), rede de drenagem pluvial (31.370m), pavimentação (116.672m²), calçada (38.477m²), meios fios (37.746m), sinalização (4.507m²), terraplenagem (57.884m²), dissipador da lagoa (1un) e plantio de grama (2.800m²). Executado até 2025: 97,57% dos serviços. Realizado até 2024: Escavação para drenagem pluvial (94.003m³), rede de drenagem pluvial (31.370m), pavimentação (116.672m²), calçada (38.477m²), meios fios (37.746m), sinalização (4.507m²), terraplenagem (55.084m²) e dissipador da lagoa (1un). Executado até 2024: 97,50%. Executado em 2023: 93,32%. Contrato nº 19/2021 (MT VA). Processo(s) nº: 00110-00001255/2020-68 Descentralização</p>									
0011 - Implantar Obra de Arte Especial, denominada OAE 03 - Ponte sobre o Córrego Vicente Pires. Etapa anterior nº 0013/2024 - UO 22101 1 - Institucional 3023 - Projeto 3 - Obras de urbanização	218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	30 - REGIÃO XXX - VICENTE PIRES	01/07/2023	28/02/2025	-	-	AN-Anulada
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 218 - PROGRAMA REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; Detalhamento: Sem realização no período. Não houve realização física da obra durante o período de vigência do contrato, apenas a implantação de canteiro de obras e o pagamento de administração do contrato. Executado até 2024: 6,98%. Executado em 2023: 1,18%. Contrato nº 014/2023 (AS). Processo(s) nº: 00110-00001680/2023-08, 00110-00002305/2022-96 Descentralização</p>									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
(*) 15.451.6209.3023.0077 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES									
0012 - Executar obras de infraestrutura urbana remanescentes no intitulado Lote 02, do Setor Habitacional Vicente Pires. Etapa anterior nº 0014/2024 - UO 22101 1 - Institucional 3023 - Projeto 3 - Obras de urbanização	218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	972.550	30 - REGIÃO XXX - VICENTE PIRES	15/04/2024	11/06/2026	-	-	AT-Atrasada
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 218 - PROGRAMA REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; Detalhamento: Realizado no período: Escavação (3.500m³). Acumulado até 2025: Drenagem (4.064m), pavimentação asfáltica (4.840m), meios fios (1.135m), dissipadores (5un) e calçadas (364m²), mobilização e canteiro de obras (100%). Executado até 2025: 16,96% dos serviços. Realizados até 2024: Drenagem (4.064m), pavimentação asfáltica (4.840m), meios fios (1.135m), dissipadores (5un) e calçadas (364m²), mobilização e canteiro de obras (100%). Executado até 2024: 16,75%. Contrato nº 29/2023 (MT). Processo(s) nº: Descentralização</p>									

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
(*) 15.451.6209.3058.0002 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA									
0013 - Revisar e readequar os projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D'Armas. Etapa anterior nº 0015/2024 - UO 22101 1 - Institucional 3058 - Projeto 3 - Obras de urbanização	28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	1	6 - REGIÃO VI - PLANALTINA	01/12/2021	20/04/2025	-	-	AT-Atrasada
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 28 - ÁREA URBANIZADA - jan: 0,00; fev: 0,00; Detalhamento: Realizado no período: Projeto executivo (2%) e orçamento/aprovação (2%). Acumulado até 2025: Plano de trabalho/cronograma (100%), estudos preliminares (100%), projeto executivo (97%), estudo capacidade do córrego (100%) e orçamento/aprovação (94%). Executado até 2025: 98% dos serviços. Acumulado até 2024: 97% dos serviços. Executado até 2023: 96% dos serviços. Contrato nº 21/2021 (WJM). Processo(s) nº: 00110-00001868/2020-03, 00110-00002878/2021-39 Descentralização</p>									

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
(*) 15.451.6209.3058.0003 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL									
0014 - Executar infraestrutura urbana no Trecho 01 e parte do Trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente. Etapa anterior nº 0017/2024 - UO 22101 1 - Institucional 3058 - Projeto 3 - Obras de urbanização	28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	2.949.088	32 - REGIÃO XXXII - SOL NASCENTE / PÔR DO SOL	20/07/2022	31/03/2025	-	-	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 28 - ÁREA URBANIZADA - jan: 0,00; fev: 0,00; Detalhamento: Realizado no período: drenagem pluvial (80m), pav. asfáltica (2.000m²), pav. intertravado (3.000m²) e meios-fios (600m). Executado no período: 2% dos serviços. Acumulado até 2025: escavação lagoas (60.910m³), drenagem pluvial (6.168m), pav. asfáltica (11.880m²), pav. intertravado (23.963m²), meios-fios (10.474m), muro gabião (3.500m³) e colchão reno (7.500m²). Executado até 2025: 48% dos serviços. Acumulado até 2024: escavação lagoas (60.910m³), drenagem pluvial (6.088m), pav. asfáltica (9.880m²), pav. intertravado (20.963m²), meios-fios (9.873m), muro gabião (3.500m³) e colchão reno (7.500m²). Executado até 2024: 46%. Executado até 2023: 18,29%. CT.: 017/2022 (JB). Processo(s) nº: 00110-00002366/2021-72, 00110-00002335/2022-01 Descentralização									
0015 - Executar obras de infraestrutura urbana remanescentes no lote 01/trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente. Etapa anterior nº 0018/2024 - UO 22101 1 - Institucional 3058 - Projeto 3 - Obras de urbanização	28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	2.021.566	32 - REGIÃO XXXII - SOL NASCENTE / PÔR DO SOL	01/09/2022	30/05/2025	-	-	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 28 - ÁREA URBANIZADA - jan: 0,00; fev: 0,00; Detalhamento: Realizado no período: drenagem pluvial (100m) e calçadas (4.000m²). Executado no período: 2% dos serviços. Acumulado até 2025: escavação (217.120m³), drenagem pluvial (9.634m), galeria pluvial (3.689m), pavim. asfáltica (50.091m²), pavim. intertravado (124.867m²), calçadas (12.500m) e meios fios (63.702m). Executado até 2025: 74% dos serviços. Acumulado até 2024: escavação (217.120m³), drenagem pluvial (9.534m), galeria pluvial (3.689m), pavim. asfáltica (50.091m²), pavim. intertravado (124.867m²), calçadas (8.500m) e meios fios (63.702m). Executado até 2024: 72%. Executado até 2023: 33,69%. CT.:									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
(*) 15.451.6209.3058.0003 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL									
022/2022 (JB). Processo(s) nº: 00110-00002474/2021-45 Descentralização									
0016 - Executar obras de infraestrutura urbana no trecho 03/lote 2 do Setor Habitacional Sol Nascente. Etapa anterior nº 0019/2024 - UO 22101 1 - Institucional 3058 - Projeto 3 - Obras de urbanização	28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	1.572.415	32 - REGIÃO XXXII - SOL NASCENTE / PÔR DO SOL	15/09/2022	30/04/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 28 - ÁREA URBANIZADA - jan: 0,00; fev: 0,00; Detalhamento: Realizado no período: galeria pluvial (150m), pavim. asfáltica (3.000m²), pavim. intertravado (6.000m²), calçadas (2.500m²) e meios fios (3.000m). Acumulado até 2025: drenagem pluvial (9.563m), galeria pluvial (796,85m), pavim. asfáltica (34.834m²), pavim. intertravado (105.963m²), calçadas (13.000m²), meios fios (50.088m), escavação da drenagem pluvial (147.258m³) e escavação da bacia (248.409m³). Executado até 2025: 75% dos serviços. Acumulado até 2024: drenagem pluvial (9.563m), galeria pluvial (2.171m), pavim. asfáltica (31.834m²), pavim. intertravado (99.963m²), calçadas (10.500m²), meios fios (47.088m), escavação da drenagem pluvial (147.258m³) e escavação da bacia (248.409m³). Executado até 2024: 73%. Executado até 2023: 23,77%. CT.: 023/2022 (JB). Processo(s) nº: Descentralização</p>									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
15.451.6209.3089.0003 - REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS - AVENIDA W3 - PLANO PILOTO									
0017 - Restaurar pavimento da Avenida W3 Sul. Etapa anterior nº 0020/2024 - UO 22101 1 - Institucional 3089 - Projeto 3 - Obras de urbanização	169 - OBRA REALIZADA	3 - METRO QUADRADO	126.000	1 - REGIÃO I - PLANO PILOTO	22/07/2022	28/04/2025	-	-	PA-Paralisada
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 169 - OBRA REALIZADA - jan: 0,00; fev: 0,00; Detalhamento: Sem realização no período. Acumulado até 2024: Pavimento rígido (45.048m²), pavimento asfáltico (10.583m²), drenagem pluvial (122m) e meios fios (3.520m). Executado até 2024: 45%. Executado até 2023: 25%. Contrato nº 016/2022 (AAJ) Processo(s) nº: 00110-00001749/2020-42 Descentralização</p>									

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
15.451.6209.3205.0001 - REMANEJAMENTO DE REDE-Readequação / Implantação de Infraestruturas de Energia Elétrica - DF- DISTRITO FEDERAL									
0020 - Remanejar redes de distribuição de energia elétrica localizadas na via de ligação Guará - Núcleo Bandeirante. Etapa anterior nº 0026/2024 - UO 22101 1 - Institucional 3205 - Projeto 2 - Obras de energia elétrica e iluminação pública	403 - REDE REMANEJADA	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2023	07/10/2025	-	-	PA-Paralisada
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 403 - REDE REMANEJADA - jan: 0,00; fev: 0,00; Detalhamento: Realizado no período: Não houve realização no período. Acumulado até 2024: Encerramento técnico/administrativo (10%), implantação de postes (11un) e retirada de postes (12un). Executado até 2024: 0% dos serviços. Executado até 2024: 91% dos serviços. Executado em 2023: 85% dos serviços. CT.: 017/2023 (EGT). Processo(s) nº: 00110-00003373/2022-72, 00110-00002390/2023-73 Descentralização</p>									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
(**) 15.451.6209.3856.0001 - GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL									
0018 - Supervisionar e apoiar no desenvolvimento de projetos e na execução da obra de readequação da Estrada Parque Indústrias Gráficas - EPIG. Etapa anterior nº 0021/2024 - UO 22101 1 - Institucional 3856 - Projeto -	130 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	05/08/2022	30/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 130 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA - jan: 0,00; fev: 0,00; Detalhamento: Realizado no período: 2 Relatórios de acompanhamento de obras. Acumulado até 2025: 31 Relatórios sendo: 1 Relatório inicial e 30 Relatórios de acompanhamento de obra. Executado até 2025: 88,80%. Acumulado até 2024: 29 Relatórios sendo: 1 Relatório inicial e 28 Relatórios de acompanhamento de obra. Executado até 2024: 76%. Executado até 2023: 28,28%. CT.: 019/2022 (AG SJ). Processo(s) nº: 00110-00002637/2020-17 Descentralização</p>									
0019 - Realizar serviços geotécnicos/ geológicos (Lote 1) e de controle tecnológico laboratorial (Lote 2) para subsidiar à elaboração de projetos e à fiscalização/ acompanhamento de obras sob a responsabilidade desta Secretaria. Etapa anterior nº 0023/2024 - UO 22101 1 - Institucional 3856 - Projeto -	130 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/06/2023	28/02/2025	-	-	AN-Anulada
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 130 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA - jan: 0,00; fev: 0,00; Detalhamento: Sem realização no período. Acumulado até 2024: sondagem (1.490m), serviços geotécnicos e ensaios - lote 1 (485un), viga benkelman (760m) e serviços de laborat. e controle tecnológico - lote 2 (622un). Executado até 2024: 7% (redução proporcional devido à celebração de aditivo financeiro). Executado em 2023: 8,82%. Contrato nº 8/2023 (TO).</p>									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
(**) 15.451.6209.3856.0001 - GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL									
Processo(s) nº: 00110-00000149/2023-18, 00110-00001683/2023-33 Descentralização									

15.451.6209.9128.0002 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - DISTRITO FEDERAL										
0031 - Remunerar mensalmente a Concessionária (Contraprestação Mensal Efetiva - CME), conforme estipulado no Contrato de Concessão dos Serviços de Iluminação Pública no Distrito Federal, cujo extrato consta publicado no DODF nº 227, de 6/12/2023.										
1 - Institucional	1 - -	99 - -	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal	
9128 - Operação Especial										
-										
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 1 - - - jan: 1,00; fev: 1,00; Detalhamento: PAGAMENTO EFETUADO - Pagamento de contraprestação mensal efetiva (CME) - Contrato de Concessão dos Serviços de Iluminação Pública no DF (CE) - Proc.: 04028-00000113/2025-60 (CME janeiro) e 04028-00000228/2025-54 (CME fevereiro). Processo(s) nº: 04028-00000572/2023-81 Descentralização										

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
(***) 15.752.6209.8507.6471 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL									
0032 - Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal. 1 - Institucional 8507 - Atividade -	269 - SISTEMA MANTIDO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 269 - SISTEMA MANTIDO - jan: 20992898,00; fev: 23724883,00;
Detalhamento: Consumo de energia elétrica (kwh) do Parque de Iluminação Pública, conforme quantidades informadas nos respectivos meses. Contrato nº 6/2023 (CE).
Processo(s) nº: 00110-00000605/2023-11, 00110-00001353/2023-48
Descentralização

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
15.782.6216.3054.0002 - CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA									
0021 - Fornecer e instalar sistema de automação, controle e transmissão de dados do Túnel de Taguatinga. Etapa anterior nº 0031/2024 - UO 22101 1 - Institucional 3054 - Projeto 12 - Obras para fins de segurança de trânsito	365 - TÚNEL CONSTRUÍDO	1 - UNIDADE	1	3 - REGIÃO III - TAGUATINGA	01/07/2023	19/08/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 365 - TÚNEL CONSTRUÍDO - jan: 0,00; fev: 0,00; Detalhamento: Realizado no período: montagem/inst. sistema automação (1,5%). Executado no período: 1% dos serviços. Acumulado até 2025: entrega materiais automação/transmissão dados (99%), inst. automação/transmissão dados (98%), recebimento equipam. de automação/transmissão dados (98%), montagem/inst. sistema (95,5%), fornec. e inst. mat. elétricos dos STD's (98%) e fornec. sistema ar condicionado central (48%). Executado até 2025: 89%. Executado até 2024: 88%. Executado em 2023: 50%. Contrato nº 15/2023 (EGT). Processo(s) nº: 00110-00000788/2024-56 Descentralização</p>									
0036 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à obra de implantação do corredor de transporte coletivo do eixo oeste. 1 - Institucional 3054 - Projeto 11 - Obras de transporte	365 - TÚNEL CONSTRUÍDO	1 - UNIDADE	1	3 - REGIÃO III - TAGUATINGA	03/02/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 365 - TÚNEL CONSTRUÍDO - fev: 0,00; Detalhamento: Pagamento de despesa referente ao reconhecimento de dívida publicado no DODF nº 117, de 30/01/2025, p. 117. Despesa do Contrato nº 18/2023 (implantação de calçadas e rampas de acessibilidade, incluindo a implantação de mobiliário urbano, na Av. Central de Taguatinga, denominada Boulevard). AC Processo(s) nº: 00110-00002836/2023-60 Descentralização</p>									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
15.782.6216.3054.0002 - CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA									

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
(*) (**) 15.782.6216.3119.0004 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE									
0022 - Reformular sistema viário na Estrada Setor Policia Militar (ESPM), no trecho entre a interseção da EPIG/ESPM e o viaduto da W3 Sul. Etapa anterior nº 0034/2024 - UO 22101 1 - Institucional 3119 - Projeto 11 - Obras de transporte	387 - CORREDOR IMPLANTADO	5 - KILOMETRO	9	83 - .DF-REGIÃO OESTE	15/10/2021	30/04/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 387 - CORREDOR IMPLANTADO - jan: 0,00; fev: 0,00; Detalhamento: Realizado no período: Plantio de grama (14.307m²) e tracionamento de escudo metálico (5,90m²). Executado no período: 2% dos serviços. Acumulado até 2025: Terraplenagem (88.395m³), pavimento rígido (17.182m²), pavimento asfáltico (24.007m²), meios-fios (8.517m), escavação da drenagem (391.763m³), drenagem pluvial - escudo metálico (4un), drenagem pluvial (22.297m), sinalização (320m²), paisagismo (125.000m²), plantio de grama (208.654m²) e tracionamento de escudo metálico (9,50m²). Executado até 2025: 98% dos serviços. Acumulado até 2024: Terraplenagem (88.395m³), pavimento rígido (17.182m²), pavimento asfáltico (24.007m²), meios-fios (8.517m), escavação da drenagem (391.763m³), drenagem pluvial - escudo metálico (4un), drenagem pluvial (22.297m), sinalização (320m²), paisagismo (125.000m²) e plantio de grama (194.347m²). Executado até 2024: 95%. Executado até 2023: 77,29%. CT.: 022/2021 (AS). Processo(s) nº: 00110-00002168/2020-28, 00110-00002936/2021-24 Descentralização</p>									
0023 - Requalificar a Etapa 2 da Avenida Hélio Prates, entre a QNG/QI 1 e a EPCT (DF-001) - Pistão Norte, Taguatinga. Etapa anterior nº 0035/2024 - UO 22101 1 - Institucional 3119 - Projeto 11 - Obras de transporte	387 - CORREDOR IMPLANTADO	5 - KILOMETRO	6	83 - .DF-REGIÃO OESTE	01/05/2022	06/06/2025	-	-	PA-Paralisada
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 387 - CORREDOR IMPLANTADO - jan: 0,00; fev: 0,00; Detalhamento: Sem realização no período. Acumulado até 2025: meios-fios (3.157m), calçadas (5.716m²), pavimento rígido (8.439m²), pavimento flexível (9.409m²), placa de transição (960m²), rede de drenagem pluvial (1.726m), galeria pluvial (1.328m), ciclovia (1.938m²) e muro gabião (14.285m³). Executado até 2025:</p>									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
(*) (**) 15.782.6216.3119.0004 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE									
56,50% dos serviços. Realizado até 2024: meios-fios (3.157m), calçadas (5.716m²), pavimento rígido (8.439m²), pavimento flexível (9.409m²), placa de transição (960m²), rede de drenagem pluvial (1.726m), galeria pluvial (1.328m), ciclovia (1.938m²) e muro gabião (14.285m³). Executado até 2024: 56,50%. Executado até 2023: 47,53%. Contrato nº 9/2022 (CAV). Processo(s) nº: 00110-00002168/2020-28, 00110-00002936/2021-24 Descentralização									
0024 - Readequar a Rodovia DF-011, denominada Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG), no âmbito do Corredor de Transporte Público Eixo-Oeste. Etapa anterior nº 0036/2024 - UO 22101 1 - Institucional 3119 - Projeto 11 - Obras de transporte	387 - CORREDOR IMPLANTADO	5 - KILOMETRO	6	83 - .DF-REGIÃO OESTE	01/09/2022	30/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 387 - CORREDOR IMPLANTADO - jan: 0,00; fev: 0,00; Detalhamento: Realizado no período: Trecho 1: OAE 1 (2,88%). Trecho 2: terraplenagem (30,30%) e pav. asfáltico (6,88%). Trecho 4: terraplenagem (23,94%). Trecho 6: terraplenagem (5,20%) e drenagem (3,12%). Executado no período: 3,64% dos serviços. Acumulado até 2025: Estudos prelim./proj.(70%). Trecho 1: terraplenagem (92,30%), pav. asfáltica (87%), drenagem (97%), pav. rígido (57%), calçadas (21%), ciclovia (32%), sinalização (15%), OAE 1 (98,88%) e OAE 3 (98%). Trecho 2: terraplenagem (92,30%) e pav. asfáltico (32,88%). Trecho 4: terraplenagem (66,94%). Trecho 5: terraplenagem (32%) e drenagem (46%). Trecho 6: terraplenagem (91,20%) e drenagem (96,12%). Executado até 2025: 46,15% dos serviços Realizado até 2024: Estudos prelim./proj.(70%). Trecho 1: terraplenagem (92%), pav. asfáltica (87%), drenagem (97%), pav. rígido (57%), calçadas (21%), ciclovia (32%), sinalização (15%), OAE 1 (96%) e OAE 3 (98%). Trecho 2: terraplenagem (62%) e pav. asfáltico (26%). Trecho 4: terraplenagem (43%). Trecho 5: terraplenagem (32%) e drenagem (46%). Trecho 6: terraplenagem (86%) e drenagem (93%). Executado até 2024: 42,51%. Executado até 2023: 8,50%. Contrato nº 21/2022 (BA) Processo(s) nº: 00110-00002590/2020-83, 00110-00002332/2022-69 Descentralização									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
(*) (**) 15.782.6216.3119.0004 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE									
0027 - Executar obras no acesso ao Terminal da Asa Sul - TAS, em poligonal de área aproximada de 12 ha, incluindo a revitalização de OAE. Etapa anterior nº 0062/2024 - UO 22101 1 - Institucional 3119 - Projeto 11 - Obras de transporte	387 - CORREDOR IMPLANTADO	5 - KILOMETRO	6	83 - .DF-REGIÃO OESTE	13/05/2024	31/12/2026	-	-	PA-Paralisada
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 387 - CORREDOR IMPLANTADO - jan: 0,00; fev: 0,00; Detalhamento: Realizado no período: Sem execução no período. Acumulado até 2025: Proteção de taludes (5.231m²), pavimento rígido (6.558m²), sinalização viária (1.678m²), drenagem pluvial (459m), plantio de grama (34.845m²), meios-fios (1.832m), fresagem (5.976m²) e bocas de lobo (17un). Executado até 2025: 97% dos serviços. Realizado até 2024: Proteção de taludes (5.231m²), pavimento rígido (6.558m²), sinalização viária (1.678m²), drenagem pluvial (459m), plantio de grama (34.845m²), meios-fios (1.832m), fresagem (5.976m²) e bocas de lobo (17un). Executado até 2024: 97%. Contrato nº 2/2024 (AC). Processo(s) nº: 00110-00002866/2023-76, 00110-00001479/2024-01 Descentralização</p>									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	

17.512.6209.3855.0001 - GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO--DISTRITO FEDERAL

0034 - Realizar gestão ambiental na execução de obras no DF. 1 - Institucional 3855 - Projeto 999 - Serviços de Engenharia	218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
---	--------------------------	-------------	---	-----------------------	------------	------------	---	---	---------------------

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 218 - PROGRAMA REALIZADO - jan: 1,00; fev: 0,00;
Detalhamento: Realizado no período: Pagamento de Taxa de Compensação Florestal (1unid).
Processo(s) nº: 00110-00000137/2025-47
Descentralização

28.846.0001.9041.0021 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL

0039 - Converter licença prêmio em pecúnia - Servidor Inativo. 1 - Institucional 9041 - Operação Especial -	457 - LICENÇA CONVERTIDA	1 - UNIDADE	5	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
--	--------------------------	-------------	---	-----------------------	------------	------------	---	---	---------------------

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 457 - LICENÇA CONVERTIDA - jan: 6,00; fev: 5,00;
Detalhamento: Licenças convertidas.
Processo(s) nº: 00110-00000228/2025-82, 00110-00000619/2025-05
Descentralização

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	

28.846.0001.9050.0073 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL

0037 - Pagar indenizações/restituições/ressarcimentos a servidores. 1 - Institucional 9050 - Operação Especial -	458 - PAGAMENTO EFETUADO	1 - UNIDADE	31	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
---	--------------------------	-------------	----	-----------------------	------------	------------	---	---	---------------------

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 458 - PAGAMENTO EFETUADO - jan: 0,00; fev: 1,00;
Detalhamento: Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos (indenizações de 1/3 de férias e de férias proporcionais).
Processo(s) nº: 00110-00000227/2025-38, 00110-00000617/2025-16
Descentralização

28.846.0001.9093.0032 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL

0038 - Pagar outros ressarcimentos/indenizações/restituições a servidores. 1 - Institucional 9093 - Operação Especial -	458 - PAGAMENTO EFETUADO	1 - UNIDADE	60	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
--	--------------------------	-------------	----	-----------------------	------------	------------	---	---	---------------------

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 458 - PAGAMENTO EFETUADO - jan: 41,00; fev: 43,00;
Detalhamento: Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos (indenizações de transporte e Ressarcimento do Plano Odontológico - GDF).
Processo(s) nº: 00110-00000227/2025-38, 00110-00000617/2025-16
Descentralização

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio
