




GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Relatório de Desempenho Físico-Financeiro por Programa de Trabalho

1º Bimestre de 2025

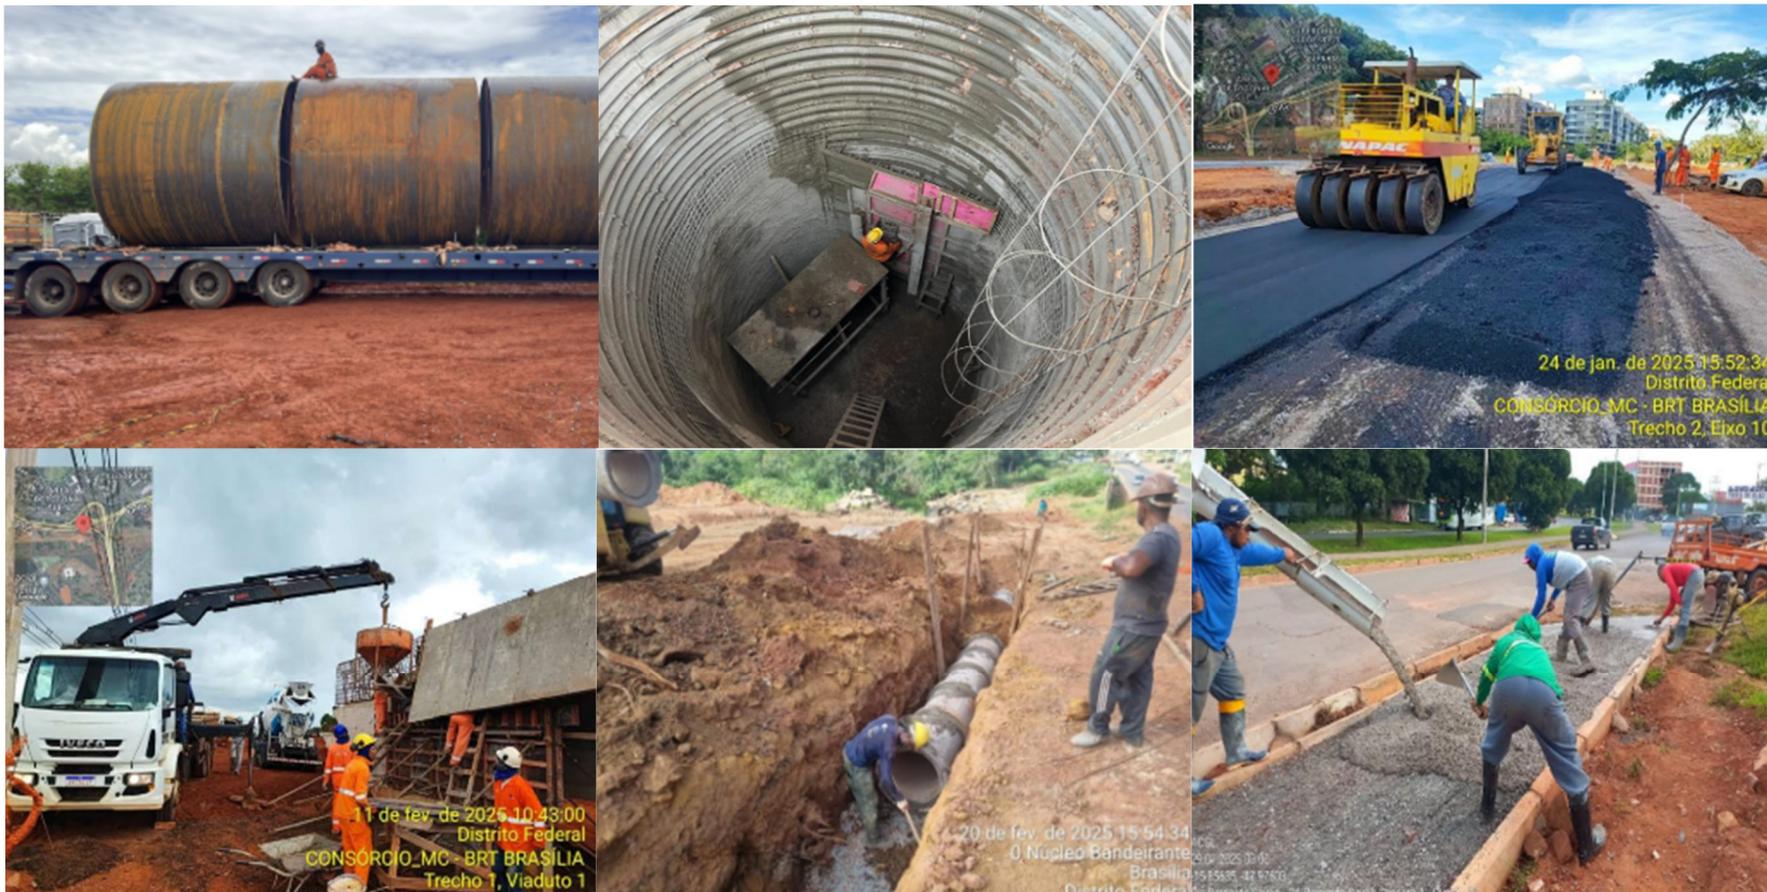

Fonte: Relatório de Desempenho Físico-Financeiro por Programa de Trabalho - Anexo I, páginas 389 a 405, publicado no site da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal https://economia.df.gov.br/documents/d/seec/2025_sag_1-bim-1-pdf-1

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
15.122.8209.8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B		(358.986.204)	0	75.246.947	64.519.114	98
		A	437.510.028	78.523.824	17	75.246.947	64.519.114	98
15.122.8209.8502.0020 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 200	F	B		(19.894.023)	0	4.124.860	4.124.860	98
		A	24.103.588	4.209.565	17	4.124.860	4.124.860	98

Etapa: 0001-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 188,00; fev: 189,00;

Detalhamento: Servidores ativos remunerados.

Processo(s) nº: 00110-00000227/2025-38, 00110-00000617/2025-16

15.122.8209.8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B		(58.174.868)	0	16.213.565	10.186.666	97
		A	77.116.966	18.942.098	16	16.213.565	10.186.666	97
15.122.8209.8504.0015 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 200	F	B		(1.108.859)	0	211.668	211.668	97
		A	1.326.393	217.534	16	211.668	211.668	97

Etapa: 0002-Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 170,00; fev: 175,00;

Detalhamento: Benefícios concedidos: auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio creche/pré-escola e auxílio natalidade.

Processo(s) nº: 00110-00000227/2025-38, 00110-00000617/2025-16

15.122.8209.8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B		(41.259.643)	0	7.158.791	4.856.159	8
		A	51.209.507	9.949.864	10	7.158.791	4.856.159	8

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
15.122.8209.8517.0034 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		B		(2.554.540)	0	63.052	23.358	8
		A	2.844.620	290.080	10	63.052	23.358	8

Etapa: 0003-Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 1,00; fev: 1,00;

Detalhamento: Aquisição de: carimbos; serviços de manutenção preventiva, desinstalação e reinstalação no aparelhos de Ar condicionada e cortina de Ar e Serviço de manutenção preventiva e corretiva no portão eletrônico e porta automática das dependências desta Secretária.

Processo(s) nº: 00110-00003268/2024-03, 00110-00000251/2024-96, 00110-00000032/2820-24

15.126.8209.2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	F	B		(4.218.415)	0	578.853	561.731	8
		A	4.960.531	742.116	11	578.853	561.731	8
15.126.8209.2557.0029 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		B		(851.992)	0	24.276	8.155	8
		A	960.531	108.539	11	24.276	8.155	8

Etapa: 0004-Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 1,00; fev: 0,00;

Detalhamento: Serviços de telefonia fixa baseada na tecnologia de Voz sobre IP - VOIP; serviços de outsourcing de Impressão, com disponibilização de impressoras multifuncionais.

Processo(s) nº: 00110-00000935/2023-15, 00110-00000096/2024-16

15.451.6208.1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	F	B		(4.129.433)	0	3.796.660	0	0
		A	10.500.000	6.370.567	61	3.796.660	0	0

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
(**) 15.451.6208.1968.0018 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-- DISTRITO FEDERAL PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 5		B		(4.129.433)	0	3.796.660	0	0
		A	10.500.000	6.370.567	61	3.796.660	0	0

Etapa: 0005-Executar serviços geotécnicos/geológicos (lote 1) e de controle tecnológico/laboratorial (lote 2), destinados a elaboração de projetos e à fiscalização/ acompanhamentos das obras. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 0,00;

Detalhamento: Sem realização no período. Executado até 2024: 43,02%. Executado até 2023: 35,89%. Contrato nº 16/2023 (MGR, JFF).

Processo(s) nº: 00110-00000520/2023-33, 00110-00002389/2023-49

Etapa: 0035-Revisar e readequar os projetos executivos de infraestrutura urbana na Região Administrativa do Sol Nascente/Pôr do Sol, especificamente em poligonal do Pôr do Sol - RA SOL. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 0,00;

Detalhamento: Realizado no período: Coordenação (1,15%) e Plano de Trabalho (100%). Executado no período: 2,23% dos serviços. Acumulado em 2025: Coordenação (1,15%) e Plano de Trabalho (100%).

Executado em 2025: 2,23%. CT 17/2024 (MG/CS).

Processo(s) nº: 00110-00001440/2023-03

15.451.6209.1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	F	B		0	0	0	0	1
		A	0	0	90	0	0	1
15.451.6209.1110.0147 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade: 105559		B		(2.951.350)	0	8.230.917	186.221	1
		A	29.193.526	26.242.176	90	8.230.917	186.221	1

Etapa: 0006-Requalificar o Setor de Oficinas Sul - SOF Sul. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 0,00;

Detalhamento: Realizado no período: Drenagem (508m). Executado no período: 1,6% dos serviços. Acumulado até 2025: Escavação da lagoa (155.735m³), drenagem pluvial (5.912m) e pav. asfáltica (27.032m²).

Executado até 2025: 47% dos serviços. Realizado até 2024: escavação da lagoa (155.735m³), drenagem pluvial

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
--	-------------	-------------	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

(5.404m) e pav. asfáltica (27.032m²). Executado até 2024: 45,40%. Executado em 2023: 10,18%. Contrato nº 24/2022 (TG).

Processo(s) nº: 00110-00000583/2021-28

Descentralização

Etapa: 0007-Executar obras de duplicação, com extensão aproximada de 1,2 km, da Via de Ligação Guará - Núcleo Bandeirante. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 0,00;

Detalhamento: Realizado no período: drenagem pluvial (93m), calçadas (1.571m²), meios-fios (678m) e paisagismo (8.840m²). Executado no período: 4,9% dos serviços. Acumulado até 2025: drenagem pluvial (763m), calçadas (3.214m²), meios-fios (3.336m) e paisagismo (8.840m²). Executado até 2025: 64,70%. Realizado em 2024: drenagem pluvial (670m), calçadas (1.643m²), ciclovia (4.138m²), pavim. asfáltica (17.666m²), meios-fios (2.658m) e OAE sobre Córrego VP (24%). Executado até 2024: 59,80%. Executado em 2023: 1,00%. Contrato nº 23/2023 (LAGM).

Processo(s) nº: 00110-00001839/2022-03, 00110-00003176/2023-34

Descentralização

Etapa: 0028-Recompor o paisagismo do Viaduto da EPIG - Parque da Cidade. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 130000,00;

Detalhamento: Etapa física finalizada. Realizados os serviços de paisagismo/plantio de grama nas áreas adjacentes ao viaduto da EPIG - Parque da Cidade.

Processo(s) nº: 00112-00019424/2024-93

Descentralização

Unidade Orçamentária Executora: 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Portaria(s) Conjunta(s): Portaria Conjunta nº 04, de 05/08/2024, DODF de 06/08/2024

Objeto: Descentralização de créditos orçamentários (00110-00017059/2024-82), no valor total de R\$ 9.927.381,78, sendo: R\$ 877.381,78, destinados à execução do projeto de recomposição paisagística do Viaduto da EPIG - Parque da Cidade.

Etapa: 0029-Executar obras de urbanização em diversos locais do DF. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 1,00;

Detalhamento: Etapa finalizada. Serviços realizados: Implantação de meios-fios em Ceilândia, Sol Nascente e Av. Hélio Prates; Aquisição de CAP 30/45 e massa asfáltica - alça de acesso ao Viaduto de Taguatinga c/ DF-085 EPTG, QD 701 próximo à Fabrica da Linguíça (Por Sol), Rua 04 e ao longo da Av. Principal (Arniqueira), Av. da Misericórdia (Vicente Pires) e Av. do Trem Bom (Sol Nascente); Implantação de calçadas/ciclovias - proximidades da Rota de Fuga - Sia/Guará/Lúcio Costa e Implantação de paisagismo e plantio de grama - Complexo Viário Gov. Roriz.

Processo(s) nº: 00110-00017059/2024-82, 00112-00019424/2024-93

Descentralização

Unidade Orçamentária Executora: 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Portaria(s) Conjunta(s): Portaria Conjunta nº 06, de 04 de outubro de 2024, DODF nº 194, de 09/10/2024

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D – Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
--	-----	-----	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

Objeto: Descentralização de créditos de R\$ 5.780.000,00 visando dar atendimento à solicitação formalizada mediante o Ofício nº 2756/2024 - NOVACAP/PRES (00110-00019424/2024-93).

Etapa: 0030-Executar obras de restauração/recuperação de pavimento nos segmentos 3A e 12 da Rodovia DF-009 - Lago Norte. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 0,00;

Detalhamento: Realizado no período: Fresagem (254m³) e Pav. asfáltica (9.943m²). Executado no período: 25%. Acumulado até 2025: Fresagem (254m³) e Pav. asfáltica (9.943m²). Executado até 2025: 26%. Realizado em 2024: Canteiro de obras (54%). Executado até 2024 (1%). Contrato nº 9/2024 (LM).

Processo(s) nº: 00110-00001043/2024-12

Descentralização

15.451.6209.1133 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	F	B		0	0	316.456	316.456	100
		A	316.456	316.456	100	316.456	316.456	100
15.451.6209.1133.0001 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - DISTRITO FEDERAL INFRAESTRUTURA DE ENERGIA IMPLANTADA (UNIDADE) Quantidade: 1	F	B		0	0	316.456	316.456	100
		A	316.456	316.456	100	316.456	316.456	100

Etapa: 0033-Implantar rede elétrica de média e baixa tensão na Rua 1 e na Rua Principal do Assentamento 26 de Setembro. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 0,00;

Detalhamento: Realizado no período: Elaboração/adequação de projeto (1%); Aquisição de materiais (16,5%); Implantação, energização e transferência de rede de distribuição (37%). Executado no período: 54,5% dos serviços. Acumulado em 2025: Elaboração/adequação de projeto (1%); Aquisição de materiais (16,5%); Implantação, energização e transferência de rede de distribuição (37%). Executado em 2025: 54,5% dos serviços. Contrato nº 13/2024 (EGT).

Processo(s) nº: 00110-00000315/2024-59

15.451.6209.1948 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF	F	B		(910)	0	0	0	0
		A	21.001.000	21.000.090	100	0	0	0

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
15.451.6209.1948.0001 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF - REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES - DISTRITO FEDERAL PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		B		(910)	0	0	0	0
		A	21.001.000	21.000.090	100	0	0	0
<p>Etapa: 0025-Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 1). Regionalização: 99-DISTRITO FEDERAL</p> <p>Etapa Realizada</p> <p>Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 0,00;</p> <p>Detalhamento: Realizado no período: 1,27% dos Projetos Executivos. Acumulado até 2025: 90,52% dos Projetos Executivos; 40% do Orçamento, 100% dos Estudos Preliminares e 100 % do Plano de Trabalho. Executado até 2025: 92,01% dos serviços (165431743). Acumulado até 2024: 89,25% dos Projetos Executivos; 40% do Orçamento, 100% dos Estudos Preliminares e 100% do Plano de Trabalho. Executado até 2024: 92% dos serviços (158883762). Executado até 2023: 85% dos serviços. Lote 01-Contrato nº 3/2022 (BOS GCP).</p> <p>Processo(s) nº: 00110-00003128/2020-01, 00110-00001212/2022-44</p>								
<p>Etapa: 0026-Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 2). Regionalização: 99-DISTRITO FEDERAL</p> <p>Etapa Realizada</p> <p>Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 0,00;</p> <p>Detalhamento: Realizado no período: 2% dos Projetos Executivos. Executado no período: 2% dos serviços. Acumulado até 2025: 95% dos serviços. Acumulado até 2024: 89% dos Projetos Executivos; 40% do Orçamento, 100% dos Estudos Preliminares e 100% do Plano de Trabalho. Executado até 2024: 93% dos serviços (158884800). Executado até 2023: 85% dos serviços. Lote 02 - Contrato nº 4/2022 (LWC, FAMP).</p> <p>Processo(s) nº: 00110-00003128/2020-01, 00110-00001220/2022-91</p>								
15.451.6209.3023 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	F	B		(17.169.089)	0	13.236.010	0	0
		A	132.860.000	115.690.911	100	13.236.010	0	0

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
(*) 15.451.6209.3023.0073 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO- REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		B		0	0	4.627.184	0	0
		A	37.560.000	37.560.000	100	4.627.184	0	0

Etapa: 0008-Executar obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 4. **Regionalização:** 82-DF - REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 0,00;

Detalhamento: Sem realização no período. Acumulado até 2025: 17,30% dos serviços. Realizado até 2024: limpeza (8.610m²), drenagem (283m), pavimento asfáltico (3.934m²), meios-fios (1.668m), pavimento intertravado (1.908m²) e calçadas (2.007m²). Executado em 2024: 17,30%. Executado em 2023: 1,71%. Contrato nº 1/2023 (LM)

Processo(s) nº: 00110-00000512/2023-97, 00110-00000528/2022-19

Etapa: 0009-Executar obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 1. **Regionalização:** 82-DF - REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 0,00;

Detalhamento: Realizado no período: bacia de retenção (1%). Acumulado até 2025: pavimentação (4.859m²), drenagem pluvial (992m) e bacia de retenção (1%). Executado até 2025: 8,30% dos serviços. Realizado até 2024: pavimentação (4.859m²) e drenagem pluvial (992m). Executado até 2024: 8,28%. Executado em 2023: 4,78%. Contrato nº 5/2023 (BS).

Processo(s) nº: 00110-00003137/2021-75, 00110-00001118/2023-76

(*) 15.451.6209.3023.0077 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		B		(17.169.089)	0	8.608.826	0	0
		A	95.300.000	78.130.911	82	8.608.826	0	0

Etapa: 0010-Executar obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Vicente Pires. **Regionalização:** 30-REGIÃO XXX - VICENTE PIRES

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 0,00;

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
--	-----	-----	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

Detalhamento: Realizado no período: Terraplenagem (2.800m²) e plantio de grama (2.800m²). Acumulado até 2025: Escavação para drenagem pluvial (94.003m³), rede de drenagem pluvial (31.370m), pavimentação (116.672m²), calçada (38.477m²), meios fios (37.746m), sinalização (4.507m²), terraplenagem (57.884m²), dissipador da lagoa (1un) e plantio de grama (2.800m²). Executado até 2025: 97,57% dos serviços. Realizado até 2024: Escavação para drenagem pluvial (94.003m³), rede de drenagem pluvial (31.370m), pavimentação (116.672m²), calçada (38.477m²), meios fios (37.746m), sinalização (4.507m²), terraplenagem (55.084m²) e dissipador da lagoa (1un). Executado até 2024: 97,50%. Executado em 2023: 93,32%. Contrato nº 19/2021 (MT VA).

Processo(s) nº: 00110-00001255/2020-68

Etapa: 0011-Implantar Obra de Arte Especial, denominada OAE 03 - Ponte sobre o Córrego Vicente Pires. **Regionalização:** 30-REGIÃO XXX - VICENTE PIRES

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 0,00;

Detalhamento: Sem realização no período. Não houve realização física da obra durante o período de vigência do contrato, apenas a implantação de canteiro de obras e o pagamento de administração do contrato. Executado até 2024: 6,98%. Executado em 2023: 1,18%. Contrato nº 014/2023 (AS).

Processo(s) nº: 00110-00001680/2023-08, 00110-00002305/2022-96

Etapa: 0012-Executar obras de infraestrutura urbana remanescentes no intitulado Lote 02, do Setor Habitacional Vicente Pires. **Regionalização:** 30-REGIÃO XXX - VICENTE PIRES

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 0,00;

Detalhamento: Realizado no período: Escavação (3.500m³). Acumulado até 2025: Drenagem (4.064m), pavimentação asfáltica (4.840m), meios fios (1.135m), dissipadores (5un) e calçadas (364m²), mobilização e canteiro de obras (100%). Executado até 2025: 16,96% dos serviços. Realizados até 2024: Drenagem (4.064m), pavimentação asfáltica (4.840m), meios fios (1.135m), dissipadores (5un) e calçadas (364m²), mobilização e canteiro de obras (100%). Executado até 2024: 16,75%. Contrato nº 29/2023 (MT).

Processo(s) nº:

15.451.6209.3058 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA	F	B		0	0	0	0	5
		A	0	0	278	0	0	5
(*) 15.451.6209.3058.0003 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade: 130177	F	B		63.915.229	0	13.519.920	4.653.721	5
		A	36.002.000	99.917.229	278	13.519.920	4.653.721	5

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
--	-------------	-------------	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

Etapa: 0014-Executar infraestrutura urbana no Trecho 01 e parte do Trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente. **Regionalização:** 32-REGIÃO XXXII - SOL NASCENTE / PÔR DO SOL

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 0,00;

Detalhamento: Realizado no período: drenagem pluvial (80m), pav. asfáltica (2.000m²), pav. intertravado (3.000m²) e meios-fios (600m). Executado no período: 2% dos serviços. Acumulado até 2025: escavação lagoas (60.910m³), drenagem pluvial (6.168m), pav. asfáltica (11.880m²), pav. intertravado (23.963m²), meios-fios (10.474m), muro gabião (3.500m²) e colchão reno (7.500m²). Executado até 2025: 48% dos serviços. Acumulado até 2024: escavação lagoas (60.910m³), drenagem pluvial (6.088m), pav. asfáltica (9.880m²), pav. intertravado (20.963m²), meios-fios (9.873m), muro gabião (3.500m³) e colchão reno (7.500m²). Executado até 2024: 46%. Executado até 2023: 18,29%. CT.: 017/2022 (JB).

Processo(s) nº: 00110-00002366/2021-72, 00110-00002335/2022-01

Etapa: 0015-Executar obras de infraestrutura urbana remanescentes no lote 01/trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente. **Regionalização:** 32-REGIÃO XXXII - SOL NASCENTE / PÔR DO SOL

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 0,00;

Detalhamento: Realizado no período: drenagem pluvial (100m) e calçadas (4.000m²). Executado no período: 2% dos serviços. Acumulado até 2025: escavação (217.120m³), drenagem pluvial (9.634m), galeria pluvial (3.689m), pavim. asfáltica (50.091m²), pavim. intertravado (124.867m²), calçadas (12.500m) e meios fios (63.702m). Executado até 2025: 74% dos serviços. Acumulado até 2024: escavação (217.120m³), drenagem pluvial (9.534m), galeria pluvial (3.689m), pavim. asfáltica (50.091m²), pavim. intertravado (124.867m²), calçadas (8.500m) e meios fios (63.702m). Executado até 2024: 72%. Executado até 2023: 33,69%. CT.: 022/2022 (JB).

Processo(s) nº: 00110-00002474/2021-45

Etapa: 0016-Executar obras de infraestrutura urbana no trecho 03/lote 2 do Setor Habitacional Sol Nascente. **Regionalização:** 32-REGIÃO XXXII - SOL NASCENTE / PÔR DO SOL

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 0,00;

Detalhamento: Realizado no período: galeria pluvial (150m), pavim. asfáltica (3.000m²), pavim. intertravado (6.000m²), calçadas (2.500m²) e meios fios (3.000m). Acumulado até 2025: drenagem pluvial (9.563m), galeria pluvial (796.85m), pavim. asfáltica (34.834m²), pavim. intertravado (105.963m²), calçadas (13.000m²), meios fios (50.088m), escavação da drenagem pluvial (147.258m³) e escavação da bacia (248.409m³). Executado até 2025: 75% dos serviços. Acumulado até 2024: drenagem pluvial (9.563m), galeria pluvial (2.171m), pavim. asfáltica (31.834m²), pavim. intertravado (99.963m²), calçadas (10.500m²), meios fios (47.088m), escavação da drenagem pluvial (147.258m³) e escavação da bacia (248.409m³). Executado até 2024: 73%. Executado até 2023: 23,77%. CT.: 023/2022 (JB).

Processo(s) nº:

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
(*) 15.451.6209.3058.0002 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS-PLANALTINA ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade: 283992		B		(151.000)	0	0	0	0
		A	14.751.000	14.600.000	99	0	0	0

Etapa: 0013-Revisar e readequar os projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D'Armas. **Regionalização:** 6-REGIÃO VI - PLANALTINA

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 0,00;

Detalhamento: Realizado no período: Projeto executivo (2%) e orçamento/aprovação (2%). Acumulado até 2025: Plano de trabalho/cronograma (100%), estudos preliminares (100%), projeto executivo (97%), estudo capacidade do córrego (100%) e orçamento/aprovação (94%). Executado até 2025: 98% dos serviços. Acumulado até 2024: 97% dos serviços. Executado até 2023: 96% dos serviços. Contrato nº 21/2021 (WJM).

Processo(s) nº: 00110-00001868/2020-03, 00110-00002878/2021-39

15.451.6209.3089 - REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS	F	B		0	0	1.000.000	0	0
		A	21.037.070	21.037.070	100	1.000.000	0	0
15.451.6209.3089.0003 - REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS - AVENIDA W3 - PLANO PILOTO OBRA REALIZADA (M2) Quantidade: 302507		B		0	0	1.000.000	0	0
		A	21.037.070	21.037.070	100	1.000.000	0	0

Etapa: 0017-Restaurar pavimento da Avenida W3 Sul. **Regionalização:** 1-REGIÃO I - PLANO PILOTO

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 0,00;

Detalhamento: Sem realização no período. Acumulado até 2024: Pavimento rígido (45.048m²), pavimento asfáltico (10.583m²), drenagem pluvial (122m) e meios fios (3.520m). Executado até 2024: 45%. Executado até 2023: 25%. Contrato nº 016/2022 (AAJ)

Processo(s) nº: 00110-00001749/2020-42

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
15.451.6209.3205 - REMANEJAMENTO DE REDE	F	B		(200.000)	0	0	0	0
		A	200.000	0	0	0	0	0
15.451.6209.3205.0001 - REMANEJAMENTO DE REDE- Readequação / Implantação de Infraestruturas de Energia Elétrica - DF- DISTRITO FEDERAL REDE REMANEJADA (UNIDADE) Quantidade: 1	F	B		(200.000)	0	0	0	0
		A	200.000	0	0	0	0	0

Etapa: 0020-Remanejar redes de distribuição de energia elétrica localizadas na via de ligação Guará - Núcleo Bandeirante. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 0,00;

Detalhamento: Realizado no período: Não houve realização no período. Acumulado até 2024: Encerramento técnico/administrativo (10%), implantação de postes (11un) e retirada de postes (12un). Executado até 2024: 0% dos serviços. Executado até 2024: 91% dos serviços. Executado em 2023: 85% dos serviços. CT.: 017/2023 (EGT).

Processo(s) nº: 00110-00003373/2022-72, 00110-00002390/2023-73

15.451.6209.3856 - GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS	F	B		(910)	0	1.867.858	127.738	5
		A	2.501.000	2.500.090	100	1.867.858	127.738	5
(**) 15.451.6209.3856.0001 - GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1	F	B		(910)	0	1.867.858	127.738	5
		A	2.501.000	2.500.090	100	1.867.858	127.738	5

Etapa: 0018-Supervisionar e apoiar no desenvolvimento de projetos e na execução da obra de readequação da Estrada Parque Indústrias Gráficas - EPIG. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 0,00;

Detalhamento: Realizado no período: 2 Relatórios de acompanhamento de obras. Acumulado até 2025: 31 Relatórios sendo: 1 Relatório inicial e 30 Relatórios de acompanhamento de obra. Executado até 2025: 88,80%. Acumulado até 2024: 29 Relatórios sendo: 1 Relatório inicial e 28 Relatórios de acompanhamento de obra.

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
--	-----	-----	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

Executado até 2024: 76%. Executado até 2023: 28,28%. CT.: 019/2022 (AG SJ).

Processo(s) nº: 00110-00002637/2020-17

Etapa: 0019-Realizar serviços geotécnicos/ geológicos (Lote 1) e de controle tecnológico laboratorial (Lote 2) para subsidiar à elaboração de projetos e à fiscalização/ acompanhamento de obras sob a responsabilidade desta Secretaria. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 0,00;

Detalhamento: Sem realização no período. Acumulado até 2024: sondagem (1.490m), serviços geotécnicos e ensaios - lote 1 (485un), viga benkelman (760m) e serviços de laborat. e controle tecnológico - lote 2 (622un). Executado até 2024: 7% (redução proporcional devido à celebração de aditivo financeiro). Executado em 2023: 8,82%. Contrato nº 8/2023 (TO).

Processo(s) nº: 00110-00000149/2023-18, 00110-00001683/2023-33

15.451.6209.9128 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	F	B		(38.412.000)	0	4.777.221	0	0
		A	43.200.000	4.788.000	11	4.777.221	0	0
15.451.6209.9128.0002 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - DISTRITO FEDERAL	F	B		(38.412.000)	0	4.777.221	0	0
		A	43.200.000	4.788.000	11	4.777.221	0	0
- (-) Quantidade: 1		A						

Etapa: 0031-Remunerar mensalmente a Concessionária (Contraprestação Mensal Efetiva - CME), conforme estipulado no Contrato de Concessão dos Serviços de Iluminação Pública no Distrito Federal, cujo extrato consta publicado no DODF nº 227, de 6/12/2023. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 1,00; fev: 1,00;

Detalhamento: PAGAMENTO EFETUADO - Pagamento de contraprestação mensal efetiva (CME) - Contrato de Concessão dos Serviços de Iluminação Pública no DF (CE) - Proc.: 04028-00000113/2025-60 (CME janeiro) e 04028-00000228/2025-54 (CME fevereiro).

Processo(s) nº: 04028-00000572/2023-81

15.752.6209.8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	F	B		(206.680.963)	0	14.000.000	10.922.267	53
		A	227.121.937	20.440.974	9	14.000.000	10.922.267	53

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
(***) 15.752.6209.8507.6471 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1		B		(206.680.963)	0	14.000.000	10.922.267	53
		A	227.121.937	20.440.974	9	14.000.000	10.922.267	53
Etapa: 0032-Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal. Regionalização: 99-DISTRITO FEDERAL Etapa Realizada Quantitativo físico executado: jan: 20992898,00; fev: 23724883,00; Detalhamento: Consumo de energia elétrica (kwh) do Parque de Iluminação Pública, conforme quantidades informadas nos respectivos meses. Contrato nº 6/2023 (CE). Processo(s) nº: 00110-00000605/2023-11, 00110-00001353/2023-48								

15.782.6216.3054 - CONSTRUÇÃO DE TÚNEL	F	B		3.999.090	0	4.657	0	0
		A	101.000	4.100.090	4.059	4.657	0	0
15.782.6216.3054.0002 - CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL-TAGUATINGA TÚNEL CONSTRUÍDO (UNIDADE) Quantidade: 1		B		3.999.090	0	4.657	0	0
		A	101.000	4.100.090	4.059	4.657	0	0

Etapa: 0021-Fornecer e instalar sistema de automação, controle e transmissão de dados do Túnel de Taguatinga. **Regionalização:** 3-REGIÃO III - TAGUATINGA
Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 0,00;
Detalhamento: Realizado no período: montagem/inst. sistema automação (1,5%). Executado no período: 1% dos serviços. Acumulado até 2025: entrega materiais automação/transmissão dados (99%), inst. automação/transmissão dados (98%), recebimento equipam. de automação/transmissão dados (98%), montagem/inst. sistema (95,5%), fornec. e inst. mat. elétricos dos STD's (98%) e fornec. sistema ar condicionado central (48%). Executado até 2025: 89%. Executado até 2024: 88%. Executado em 2023: 50%. Contrato nº 15/2023 (EGT).
Processo(s) nº: 00110-00000788/2024-56

Etapa: 0036-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à obra de implantação do corredor de transporte coletivo do eixo oeste. **Regionalização:** 3-REGIÃO III - TAGUATINGA
Etapa Realizada

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
--	-------------	-------------	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

Quantitativo físico executado: fev: 0,00;
Detalhamento: Pagamento de despesa referente ao reconhecimento de dívida publicado no DODF nº 117, de 30/01/2025, p. 117. Despesa do Contrato nº 18/2023 (implantação de calçadas e rampas de acessibilidade, incluindo a implantação de mobiliário urbano, na Av. Central de Taguatinga, denominada Boulevard). AC
Processo(s) nº: 00110-00002836/2023-60

15.782.6216.3119 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)	F	B		(455.896)	0	25.134.179	6.212.588	7
		A	85.502.000	85.046.104	99	25.134.179	6.212.588	7
(**) (*) 15.782.6216.3119.0004 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE CORREDOR IMPLANTADO (KM) Quantidade: 6		B		(455.896)	0	25.134.179	6.212.588	7
		A	85.502.000	85.046.104	99	25.134.179	6.212.588	7

Etapa: 0022-Reformular sistema viário na Estrada Setor Policia Militar (ESPM), no trecho entre a interseção da EPIG/ESPM e o viaduto da W3 Sul. **Regionalização:** 83-.DF- REGIÃO OESTE
Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 0,00;
Detalhamento: Realizado no período: Plantio de grama (14.307m²) e tracionamento de escudo metálico (5,90m²). Executado no período: 2% dos serviços. Acumulado até 2025: Terraplenagem (88.395m³), pavimento rígido (17.182m²), pavimento asfáltico (24.007m²), meios-fios (8.517m), escavação da drenagem (391.763m³), drenagem pluvial - escudo metálico (4un), drenagem pluvial (22.297m), sinalização (320m²), paisagismo (125.000m²), plantio de grama (208.654m²) e tracionamento de escudo metálico (9,50m²). Executado até 2025: 98% dos serviços. Acumulado até 2024: Terraplenagem (88.395m³), pavimento rígido (17.182m²), pavimento asfáltico (24.007m²), meios-fios (8.517m), escavação da drenagem (391.763m³), drenagem pluvial - escudo metálico (4un), drenagem pluvial (22.297m), sinalização (320m²), paisagismo (125.000m²) e plantio de grama (194.347m²). Executado até 2024: 95%. Executado até 2023: 77,29%. CT.: 022/2021 (AS).
Processo(s) nº: 00110-00002168/2020-28, 00110-00002936/2021-24

Etapa: 0023-Requalificar a Etapa 2 da Avenida Hélio Prates, entre a QNG/QI 1 e a EPCT (DF-001) - Pistão Norte, Taguatinga. **Regionalização:** 83-.DF- REGIÃO OESTE
Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 0,00;
Detalhamento: Sem realização no período. Acumulado até 2025: meios-fios (3.157m), calçadas (5.716m²), pavimento rígido (8.439m²), pavimento flexível (9.409m²), placa de transição (960m²), rede de drenagem pluvial (1.726m), galeria pluvial (1.328m), ciclovia (1.938m²) e muro gabião (14.285m³). Executado até 2025: 56,50% dos serviços. Realizado até 2024: meios-fios (3.157m), calçadas (5.716m²), pavimento rígido (8.439m²), pavimento flexível (9.409m²), placa de transição (960m²), rede de drenagem pluvial (1.726m), galeria pluvial (1.328m), ciclovia (1.938m²) e muro gabião (14.285m³). Executado até 2024: 56,50%. Executado até

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D – Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
--	-----	-----	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

2023: 47,53%. Contrato nº 9/2022 (CAV).

Processo(s) nº: 00110-00002168/2020-28, 00110-00002936/2021-24

Etapa: 0024-Readequar a Rodovia DF-011, denominada Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG), no âmbito do Corredor de Transporte Público Eixo-Oeste. **Regionalização:** 83-.DF- REGIÃO OESTE

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 0,00;

Detalhamento: Realizado no período: Trecho 1: OAE 1 (2,88%). Trecho 2: terraplenagem (30,30%) e pav. asfáltico (6,88%). Trecho 4: terraplenagem (23,94%). Trecho 6: terraplenagem (5,20%) e drenagem (3,12%). Executado no período: 3,64% dos serviços. Acumulado até 2025: Estudos prelim./proj.(70%). Trecho 1: terraplenagem (92,30%), pav. asfáltica (87%), drenagem (97%), pav. rígido (57%), calçadas (21%), ciclovia (32%), sinalização (15%), OAE 1 (98,88%) e OAE 3 (98%). Trecho 2: terraplenagem (92,30%) e pav. asfáltico (32,88%). Trecho 4: terraplenagem (66,94%). Trecho 5: terraplenagem (32%) e drenagem (46%). Trecho 6: terraplenagem (91,20%) e drenagem (96,12%). Executado até 2025: 46,15% dos serviços Realizado até 2024: Estudos prelim./proj.(70%). Trecho 1: terraplenagem (92%), pav. asfáltica (87%), drenagem (97%), pav. rígido (57%), calçadas (21%), ciclovia (32%), sinalização (15%), OAE 1 (96%) e OAE 3 (98%). Trecho 2: terraplenagem (62%) e pav. asfáltico (26%). Trecho 4: terraplenagem (43%). Trecho 5: terraplenagem (32%) e drenagem (46%). Trecho 6: terraplenagem (86%) e drenagem (93%). Executado até 2024: 42,51%. Executado até 2023: 8,50%. Contrato nº 21/2022 (BA)

Processo(s) nº: 00110-00002590/2020-83, 00110-00002332/2022-69

Etapa: 0027-Executar obras no acesso ao Terminal da Asa Sul - TAS, em poligonal de área aproximada de 12 ha, incluindo a revitalização de OAE. **Regionalização:** 83-.DF- REGIÃO OESTE

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 0,00;

Detalhamento: Realizado no período: Sem execução no período. Acumulado até 2025: Proteção de taludes (5.231m²), pavimento rígido (6.558m²), sinalização viária (1.678m²), drenagem pluvial (459m), plantio de grama (34.845m²), meios-fios (1.832m), fresagem (5.976m²) e bocas de lobo (17un). Executado até 2025: 97% dos serviços. Realizado até 2024: Proteção de taludes (5.231m²), pavimento rígido (6.558m²), sinalização viária (1.678m²), drenagem pluvial (459m), plantio de grama (34.845m²), meios-fios (1.832m), fresagem (5.976m²) e bocas de lobo (17un). Executado até 2024: 97%. Contrato nº 2/2024 (AC).

Processo(s) nº: 00110-00002866/2023-76, 00110-00001479/2024-01

17.512.6209.3855 - GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO	F	B		(273.000)	0	1.560	1.560	0
		A	3.600.000	3.327.000	92	1.560	1.560	0

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D – Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLAO) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
17.512.6209.3855.0001 - GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO--DISTRITO FEDERAL PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		B		(273.000)	0	1.560	1.560	0
		A	3.600.000	3.327.000	92	1.560	1.560	0
Etapa: 0034-Realizar gestão ambiental na execução de obras no DF. Regionalização: 99-DISTRITO FEDERAL Etapa Realizada Quantitativo físico executado: jan: 1,00; fev: 0,00; Detalhamento: Realizado no período: Pagamento de Taxa de Compensação Florestal (1unid). Processo(s) nº: 00110-00000137/2025-47								
28.846.0001.9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	F	B		0	0	0	0	66
		A	0	0	13	0	0	66
28.846.0001.9041.0021 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 5		B		(763.687)	0	75.419	75.419	66
		A	878.000	114.313	13	75.419	75.419	66
Etapa: 0039-Converter licença prêmio em pecúnia - Servidor Inativo. Regionalização: 99-DISTRITO FEDERAL Etapa Realizada Quantitativo físico executado: jan: 6,00; fev: 5,00; Detalhamento: Licenças convertidas. Processo(s) nº: 00110-00000228/2025-82, 00110-00000619/2025-05								
28.846.0001.9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	F	B		0	0	0	0	57
		A	0	0	17	0	0	57

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
28.846.0001.9050.0073 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 31		B		(775.120)	0	89.075	89.075	57
		A	932.000	156.880	17	89.075	89.075	57

Etapa: 0037-Pagar indenizações/restituições/ressarcimentos a servidores. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 1,00;

Detalhamento: Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos (indenizações de 1/3 de férias e de férias proporcionais).

Processo(s) nº: 00110-00000227/2025-38, 00110-00000617/2025-16

28.846.0001.9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	B		0	0	0	0	75
		A	0	0	13	0	0	75
28.846.0001.9093.0032 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 60		B		(1.432.868)	0	167.236	167.236	75
		A	1.656.000	223.132	13	167.236	167.236	75

Etapa: 0038-Pagar outros ressarcimentos/indenizações/restituições a servidores. **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: jan: 41,00; fev: 43,00;

Detalhamento: Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos (indenizações de transporte e Ressarcimento do Plano Odontológico - GDF).

Processo(s) nº: 00110-00000227/2025-38, 00110-00000617/2025-16

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente
